Managementul riscurilor

Matricea riscurilor · RBS · registrul riscurilor

Proiect	Companion AI pentru îngrijirea pielii – aplicație mobilă cu analiza pielii, informații despre ingrediente și rutine personalizate (lucrare de licență)
Instituție	Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică
Manager de proiect	Daria Giotina (echipă de o persoană, inițiale DG)
Sponsor	Stefan Popescu, profesor coordonator
Versiune	1.1

1. Riscurile și cum au fost identificate

Un risc este un eveniment sau o condiție incertă care, dacă apare, are un efect asupra cel puțin unui obiectiv al proiectului (calendar, efort, domeniu sau calitate). Spre deosebire de o problemă, care s-a produs deja, riscul are o probabilitate. Fiecare risc este formulat „din cauza <cauză>, poate apărea <eveniment incert>, ceea ce ar duce la <efect>” și este legat de pachetele afectate din WBS.

Procesul are patru pași, reluați pe tot parcursul proiectului: identificarea (lista riscurilor și RBS-ul), analiza (probabilitatea, impactul și matricea), planificarea răspunsului (strategii și planuri de contingență) și monitorizarea (registrul actualizat la fiecare raport lunar de stare). Sursele folosite pentru identificare:

Sursa	Riscuri găsite
Analiza ipotezelor din enunțul domeniului	R7 (consimțământ și stocare în UE), R8 (Open Beauty Facts), R9 (nivelurile gratuite), R10 (revizia în cel mult o săptămână)
Parcurgerea WBS-ului, pachet cu pachet	R1 (ramurile 1.5–1.6), R2 (1.6), R5 (1.4.5), R6 (1.4.4), R3 (1.4.6)
Anunțurile și regulamentele facultății	R4 (cerințele pentru lucrarea de licență)
Jurnalul proiectului (lecții învățate până acum)	R3 (accesul la DDI și la modele a fost blocat câteva săptămâni), R6 (23 de cazuri eFST V–VI)

Rezultatul: 10 riscuri din toate cele 4 categorii ale RBS-ului, de trei tipuri (după Sommerville): de proiect (afectează calendarul sau efortul), de produs (afectează calitatea aplicației sau a modelului) și de business (afectează folosirea rezultatelor: acceptarea tezei și a aplicației).

2. Scalele de evaluare

Probabilitatea (P) folosește o scală standard în cinci niveluri; intervalele nu se suprapun, deci fiecare procent are un singur nivel.

Nivel	Denumire	Probabilitate	Cum o recunoaștem
1	Foarte scăzută	sub 10%	Nu s-a întâmplat în proiecte asemănătoare.
2	Scăzută	10–25%	S-a întâmplat rar.
3	Moderată	25–50%	S-a întâmplat în unele proiecte.
4	Înaltă	50–75%	Se întâmplă des.

5	Foarte înaltă	peste 75%	Aproape sigur, dacă nu facem nimic.

Impactul (I) folosește aceleași cinci niveluri, dar pragurile sunt adaptate la acest proiect (43 de săptămâni și un buget de 1.282 de ore). Dacă impactul diferă pe coloane, se ia nivelul cel mai mare. Scorul este P × I, între 1 și 25.

Nivel	**Denumire**	**Calendar**	**Efort**	**Domeniu și calitate**
1	Nesemnificativ	sub 2 zile	sub 8 ore	Niciun efect vizibil asupra livrabilelor
2	Minor	până la o săptămână	8–30 ore	Un livrabil intermediar sau o funcție secundară întârzie
3	Moderat	1–3 săptămâni	30–80 ore	O funcție secundară sau un rezultat secundar lipsește la predare
4	Serios	3–6 săptămâni	80–200 ore	O funcție principală lipsește la termenul MVP-ului (31.03.2027) sau un rezultat principal al tezei e slăbit
5	Catastrofal	peste 6 săptămâni	peste 200 ore	Teza nu poate fi predată la termen

3. RBS (Risk Breakdown Structure)

RBS-ul este ierarhia surselor de risc: categorii, apoi subcategorii, iar riscurile concrete se atașează ultimului nivel. Categoriile urmează RBS-ul generic pentru proiecte software (T tehnic, P managementul proiectului, O organizațional, E extern); apar doar subcategoriile care au riscuri.



Figura 1. RBS-ul proiectului cu cele 10 riscuri, scorul și pachetele WBS afectate.

4. Matricea riscurilor (probabilitate × impact)

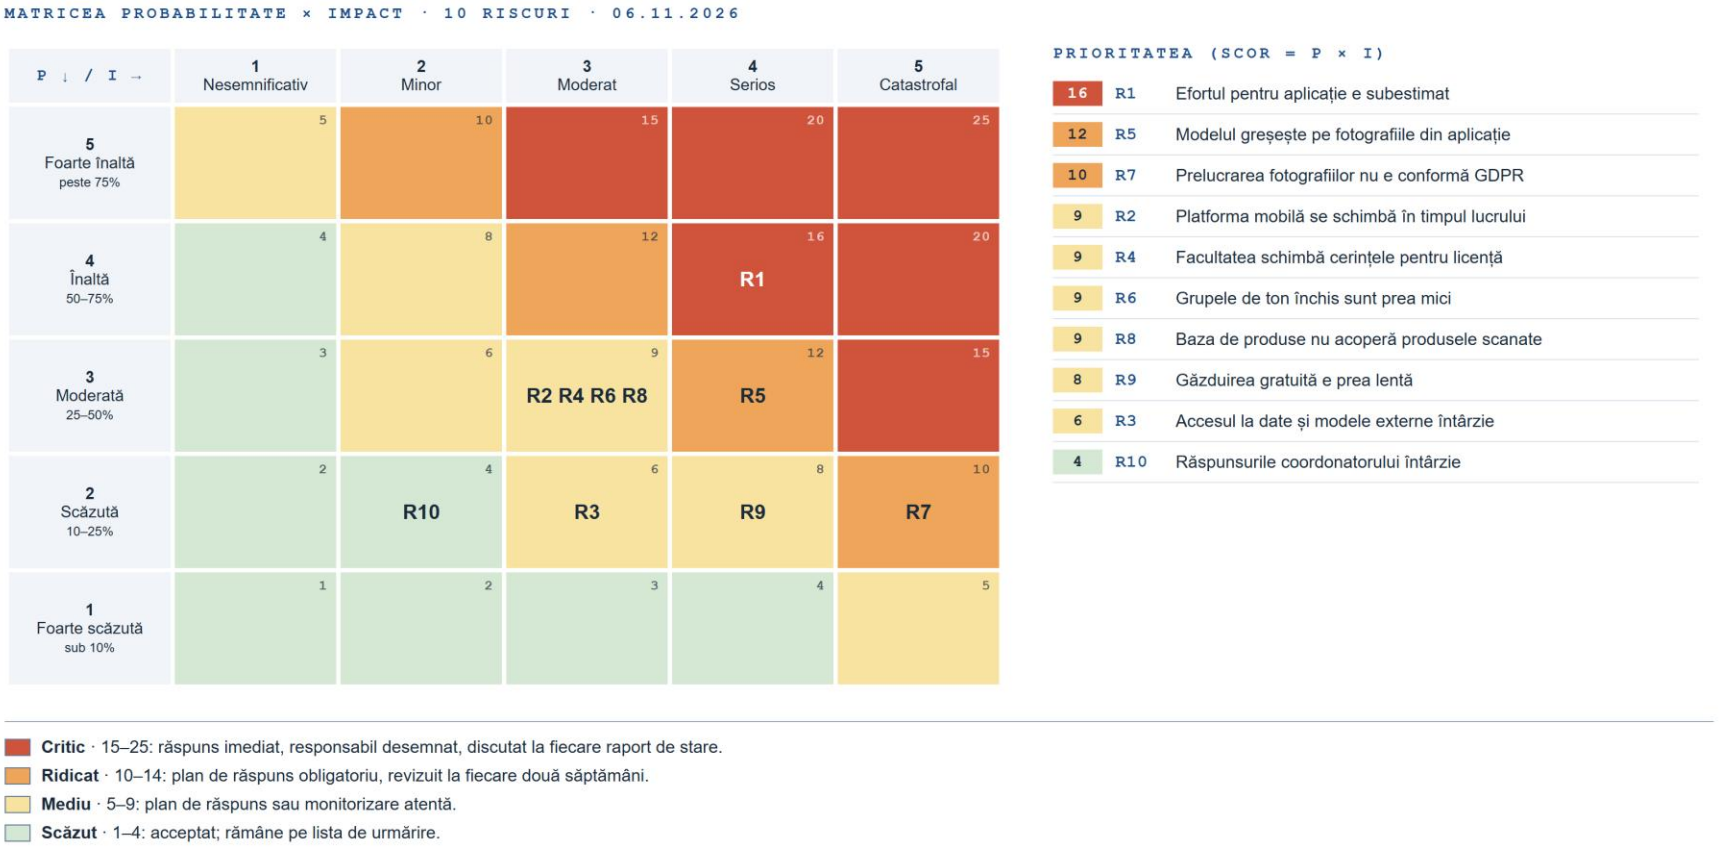


Figura 2. Matricea 5 × 5 cu ID-urile riscurilor și lista în ordinea priorității.

Riscuri pe zone: critic: R1; ridicat: R5, R7; mediu: R2, R4, R6, R8, R9, R3; scăzut: R10.

5. Registrul riscurilor

Registrul are câmpurile uzuale ale unui registru de riscuri. Responsabilul (proprietarul riscului) este DG (Daria Giotina, singurul membru al echipei); SP este sponsorul, Stefan Popescu. Același registru, ca foaie de calcul, este în fișierul Registrul_riscurilor_Giotina.xlsx.

5.1 Identificare și evaluare

ID	Risc (cauză → eveniment → efect)	RBS	WBS	Tip	P	I	Scor · zonă
R1	Backend-ul și aplicația mobilă (332 h în WBS) depind de multe biblioteci și servicii externe (Expo, camera, citirea codurilor de bare, notificări) și sunt făcute de o echipă de o persoană; efortul poate fi subestimat, iar MVP-ul nu e gata la 31.03.2027 (O3).	P1	1.5, 1.6	proiect	4	4	16 · critic
R2	Expo și React Native publică versiuni noi de mai multe ori pe an, iar bibliotecile pentru cameră, coduri de bare și notificări se actualizează odată cu ele; o versiune nouă poate scoate API-uri folosite de aplicație, iar build-ul sau camera nu mai funcționează și cer ore de migrare neplanificate.	T1	1.6, 1.9.1	produs	3	3	9 · mediu
R3	DDI cere înregistrare și acord de utilizare pe Redivis, DermLIP e restricționat pe Hugging Face, iar ponderile PanDerm vin de la autori; accesul poate întârzia, iar evaluarea externă din teză rămâne incompletă.	E1	1.4.6	proiect	2	3	6 · mediu
R4	Ghidul lucrării de licență și calendarul sesiunii 2027 sunt stabilite de facultate pe parcursul anului universitar; pot apărea cerințe noi (structura capitolelor, diagrame obligatorii, alt șablon) sau un termen de predare mai devreme, iar capitolele și formatarea tezei trebuie refăcute.	O1	1.8.4, 1.8.5	proiect	3	3	9 · mediu
R5	Modelul e antrenat pe SCIN, iar fotografiile din aplicație pot avea altă lumină, altă distanță și alte telefoane; rezultatele pot fi greșite cu încredere mare, iar funcția principală devine nesigură la beta.	T2	1.4.5, 1.7.5	produs	3	4	12 · ridicat
R6	Pielea închisă (eFST V–VI) are în jur de 23 de cazuri de test pe seed; intervalele de încredere sunt largi, iar concluziile pentru RQ3 pot fi contestate la susținere.	T3	1.4.4	produs	3	3	9 · mediu
R7	Fotografiile faciale și datele despre piele sunt categorii speciale de date; fără consimțământ explicit și evaluare de impact, beta-ul nu poate folosi fotografii reale, iar aplicația poate fi contestată la susținere.	E2	1.5.5, 1.7.4	business	2	5	10 · ridicat
R8	Scannerul depinde de Open Beauty Facts, o bază completată de voluntari; multe produse din România pot lipsi sau pot avea liste de ingrediente incomplete, iar fișa ingredientelor apare goală.	E1	1.5.3, 1.6.3	produs	3	3	9 · mediu
R9	Inferența în cloud și nivelurile gratuite (MongoDB Atlas, stocare S3) au resurse limitate; răspunsul analizei poate depăși 10 s, iar criteriul de acceptare al aplicației nu este îndeplinit.	T1	1.4.9, 1.9.1	produs	2	4	8 · mediu
R10	Coordonatorul are multe lucrări de revizuit, mai ales înainte de termene; revizia capitolelor tezei poate întârzia, iar aprobarea vine mai târziu decât s-a planificat.	P2	1.8.3, 1.8.4	proiect	2	2	4 · scăzut

5.2 Răspuns, declanșator, responsabil

ID	Strategie	Acțiuni de răspuns	Declanșator	Resp.	Stare
R1	Atenuare + contingență	După 1.5.1 (luna M5) compar orele reale cu cele 32 h estimate și re-estimez ramurile 1.5–1.6. Prioritizare MoSCoW: 1.6.5 (jurnal, poze de progres, mementouri) se taie primul, apoi 1.6.4. Plan B: demonstrație cu fluxul de analiză și scannerul, restul descris în teză ca lucru viitor.	1.5.1 depășește estimarea cu peste 20% (peste 38 h)	DG	deschis

R2	Atenuare	Versiunea Expo SDK și a bibliotecilor se fixează la începutul ramurii 1.6 (fișierul de blocare a dependențelor în depozit); actualizările se fac doar după MVP, într-o ramură separată, cu testele end-to-end rulate; notele de versiune Expo se citesc la fiecare raport lunar de stare.	Build eșuat după o actualizare sau un API folosit de aplicație marcat ca depreciat	DG	deschis
R3	Acceptare activă	DDI și DermLIP sunt deja obținute și folosite (E4, E5), iar E5 folosește și modele deschise (DINOv2, ViT ImageNet); a rămas doar PanDerm. Dacă ponderile nu vin, PanDerm trece la lucrul viitor.	Fără ponderile PanDerm până la 30.11.2026	DG	în tratare
R4	Atenuare	Teza se scrie de la început în șablonul oficial al facultății; anunțurile facultății se verifică lunar, la raportul de stare; până la 15.12.2026 se confirmă cu coordonatorul ghidul și termenele pentru 2027; formatarea finală (1.8.4) se programează cu o lună înainte de termen.	Un ghid nou sau un anunț al facultății cu alte cerințe ori alt termen	DG	deschis
R5	Atenuare	Calibrare și ieșirea „incert” (1.4.5) cu pragul ales pe validare; ghidaj la captura foto și respingerea fotografiilor neclare (1.6.2.1); hartă Grad-CAM afișată; în beta se notează cazurile în care utilizatorul nu e de acord cu rezultatul.	Peste 30% din analizele din beta ies „incert”	DG	în tratare
R6	Evitare	Nu se trag concluzii pe grupe cu sub 30 de cazuri: acestea se raportează descriptiv, iar testele se fac pe grupe agregate și pe 10 seed-uri; Fitzpatrick17k aduce date externe pe tonuri.	O grupă cu interval de încredere mai larg de 0,20 macro-F1	DG	în tratare
R7	Escaladare + atenuare	Decizia ține de universitate: coordonatorul consultă responsabilul cu protecția datelor până la 28.02.2027. În aplicație: consimțământ explicit, stocare doar în UE, date minime, export și ștergere completă (1.5.5).	Observații ale responsabilului cu protecția datelor sau niciun răspuns până la 28.02.2027	DG (escaladat la SP)	deschis
R8	Atenuare	În M5 se testează 20 de produse din magazine locale; cache local al produselor găsite; plan B: lista de ingrediente se introduce sau se fotografiază și se caută după denumirea INCI în CosIng.	Sub 60% din cele 20 de produse de test găsite	DG	deschis
R9	Transfer + atenuare	Baza de date, copiile de siguranță și disponibilitatea le asigură furnizorul serviciului gestionat (MongoDB Atlas). Modelul se exportă în ONNX, iar imaginea se micșorează înainte de încărcare; latența se măsoară în M5.	Mediana timpului de analiză peste 10 s în testul din M5	DG	deschis
R10	Acceptare	Monitorizare; textele se trimit pe bucăți, cu cel puțin două săptămâni înainte de termen; deciziile se confirmă pe e-mail.	Niciun răspuns după 10 zile	DG	deschis

6. Planurile B pentru riscurile critice

Pentru riscurile din zona critică, planul de răspuns are etape cu termen: atenuarea, declanșatorul care arată că riscul se produce, planul de contingență și rezerva. Riscul rezidual este ce rămâne după răspuns; riscul secundar apare din cauza răspunsului și intră în registru ca risc nou.

Riscul R1 · Efortul pentru aplicație e subestimat (16 · critic)

Etapa	Când	Ce facem
Atenuare	M5	Re-estimarea după 1.5.1; MoSCoW stabilit pentru ramura 1.6.
Declanșator	M5	1.5.1 depășește 38 h.
Contingență	din M6	Se taie 1.6.5, apoi 1.6.4; efortul eliberat (până la 76 h) trece la 1.6.2 și 1.6.3.
Rezervă	M8	Demonstrație cu analiza și scannerul; restul descris în teză ca lucru viitor.

- **Risc rezidual:** Aplicația livrată are mai puține funcții decât în enunț, deci cere o cerere de schimbare aprobată de sponsor.
- **Risc secundar:** Tăierea lui 1.6.5 scoate mementourile, deci utilizatorii beta pot folosi aplicația mai rar: intră în registru ca R11, la revizia din M6.

7. O oportunitate (risc pozitiv)

ID	OP1
Oportunitate	Modelul DINOv2 ajustat poate înlocui modelul din aplicație
Descriere	Ajustarea în etape a lui DINOv2 a dat macro-F1 0,589 față de 0,551 pentru sonda liniară folosită acum în aplicație și 0,519 pentru EfficientNet-B0, mai bine pe fiecare grupă de ton.
WBS	1.4.8, 1.4.9
Strategie	Exploatare
Acțiuni	Varianta cu umplere în oglindă se antrenează și devine candidatul pentru versiunea următoare a modelului; trecerea cere un nou export, detectorul de imagini neobișnuite reajustat și testele serviciului de inferență.

8. Monitorizarea

- Registrul se revizuiește la fiecare raport lunar de stare (pachetul WBS 1.1.5); riscurile critice și cele ridicate se verifică la fiecare două săptămâni, la întâlnirea cu coordonatorul.
- Primele cinci riscuri după scor (R1, R5, R7, R2, R4) intră în raportul de stare, cu scorul curent și acțiunile făcute.
- Riscurile noi intră pe listă (de exemplu riscurile secundare din planurile B), iar cele trecute se închid (de exemplu R3, când E5–E6 sunt încheiate sau mutate la lucrul viitor).
- Un risc produs devine problemă: se aplică planul B și se notează în jurnalul proiectului.
- Prima revizie: la raportul de stare din noiembrie 2026 (M4).
